Sanierung reformierte Kirche
4900 Langenthal

Bauprogramm

Nr.	Vorgangsname
1	Orgel Schutzmassnahmen
2	Demontage Taufstein
3	Bauplatzinstallation
4	Demontage Haupteingangstüre
5	Ausserbetriebnahme/Demontagen Elektro/Heizung/Sanitär
6	Provisorien Elektro/Wasser
7	Schadstoffsanierung
8	Abbruch best. Natursteinbelag Schiff
9	Bodenschlitze für Heizungsinstallation
10	Rückbau Empore inkl. Treppe
11	Neue Kanalisations- und Fernwärmeleitungen
12	Elektro- / Heizung- / Sanitärinstallation
13	Ausbau neuer Heizungsraum
14	Sanierung Verstärkung alter Kohlenkeller
15	Mauerwerksergänzungen innen
16	Flächengerüst innen
17	Elektroinstallation Estrichboden
18	Dämmungen Estrichboden / Dachschräge
19	Einbau Wärmeerzeugung / Pelletanlage
20	Best. Deckenholzwerk reinigen/auffrischen
21	Innenwände reinigen inkl. notwendige Reparaturen
22	Innenwände neu streichen
23	Reparatur / Ergänzungen Kirchenfenster
24	Einbau neue Holzfenster
25	Demontage Flächengerüst
26	Einbau Empore mit Treppe
28	Einbau neuer Nautursteinbelag Schiff/Eingang/Begegnungsraum
29	Auffrischung Natursteinbelag Chor
30	Ausbau WC / Office
31	Einbau Glas- und Türabschlüsse
32	Einbau Innenwandverkleidungen
33	Leuchtenmontage mit Hebebühne
34	Inbetriebnahme Heizung
35	Fassadengerüst aussen
36	Dach- / Spenglerreparaturen
37	Trockenreinigung Mauerwerk
38	Neue Fensteraufdoppelungen aussen
39	Reinigung / Auffrischung Kirchenturm
40	Fassade neu streichen
41	Ausbau Elektroinstallation
42	Ausbau Kirchensteuerung
43	Ausbau Beamer / Beschallung etc.
44	Demontage Fassadengerüst aussen
45	Instandstellung Umgebung
46	Abnahmen
53	Inbetriebnahmen
54	Mängelbehebungen
55	Reservezeit
56	Übergabe an Bauherrschaft
57	Renovation Orgel (nachträglich)

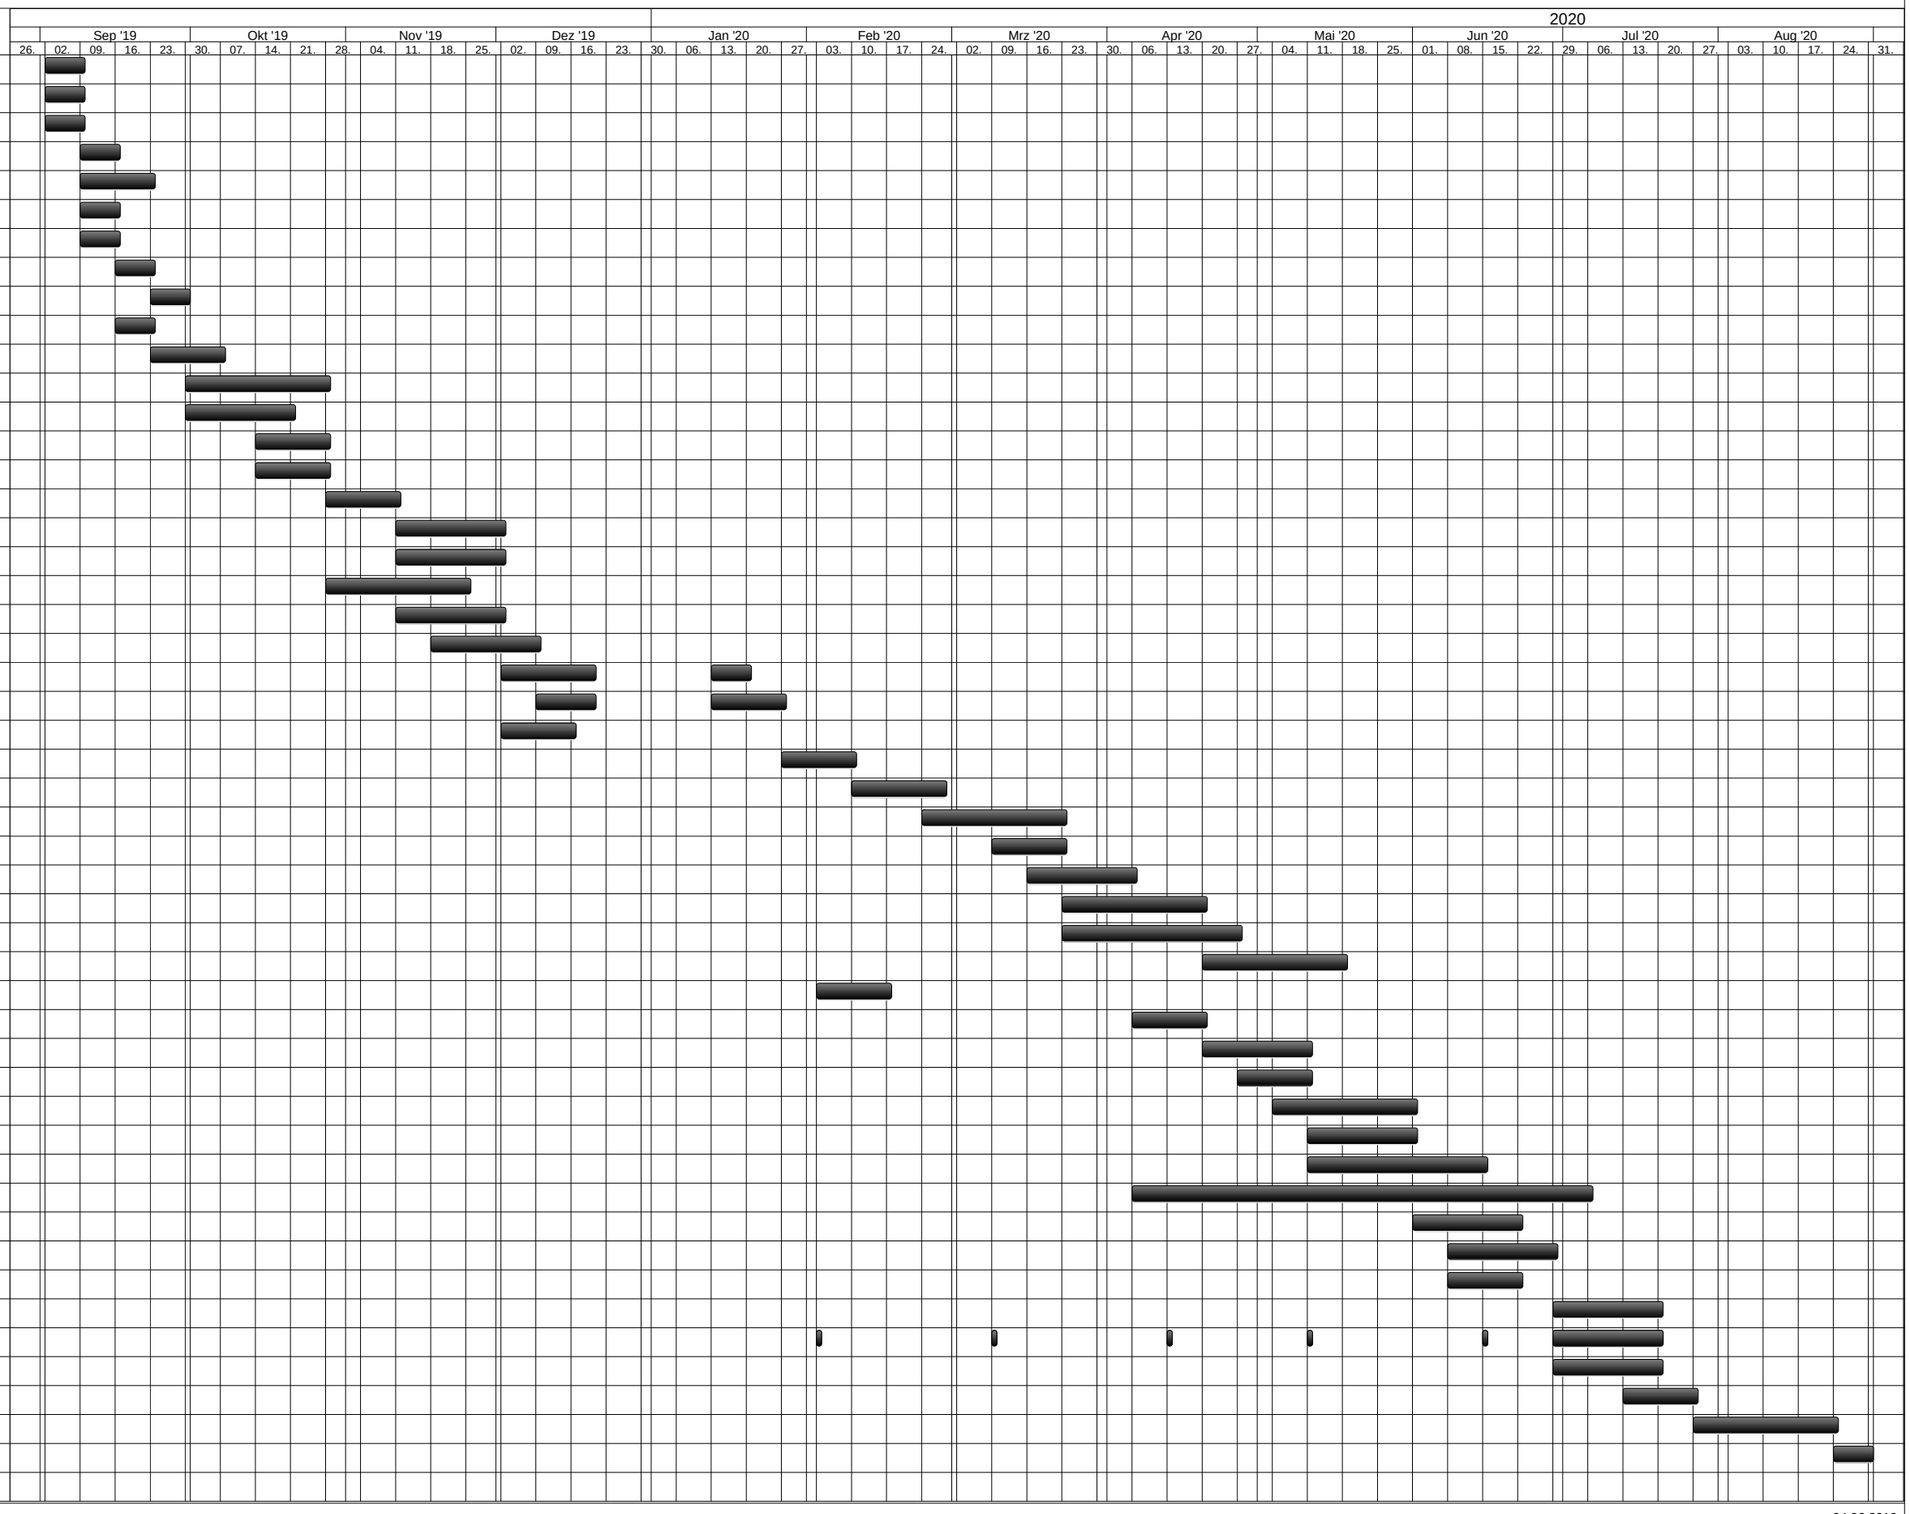

Bauherrschaft: reformierte Kirchgemeinde, Langenthal
Architekt: Hull Inoue Radlinsky, Zürich
Bauleitung: Batimo AG Architekten SIA, Zofingen

04.06.2019
rev. 07.08.2019
